



Future Organization

การขออนุมัติ
รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 3



Impacts

Solutions

Causes


Outcomes

การขออนุมัติล่าช้ากว่า ส่วนใหญ่ 3 เดือน



Process

Stakeholders

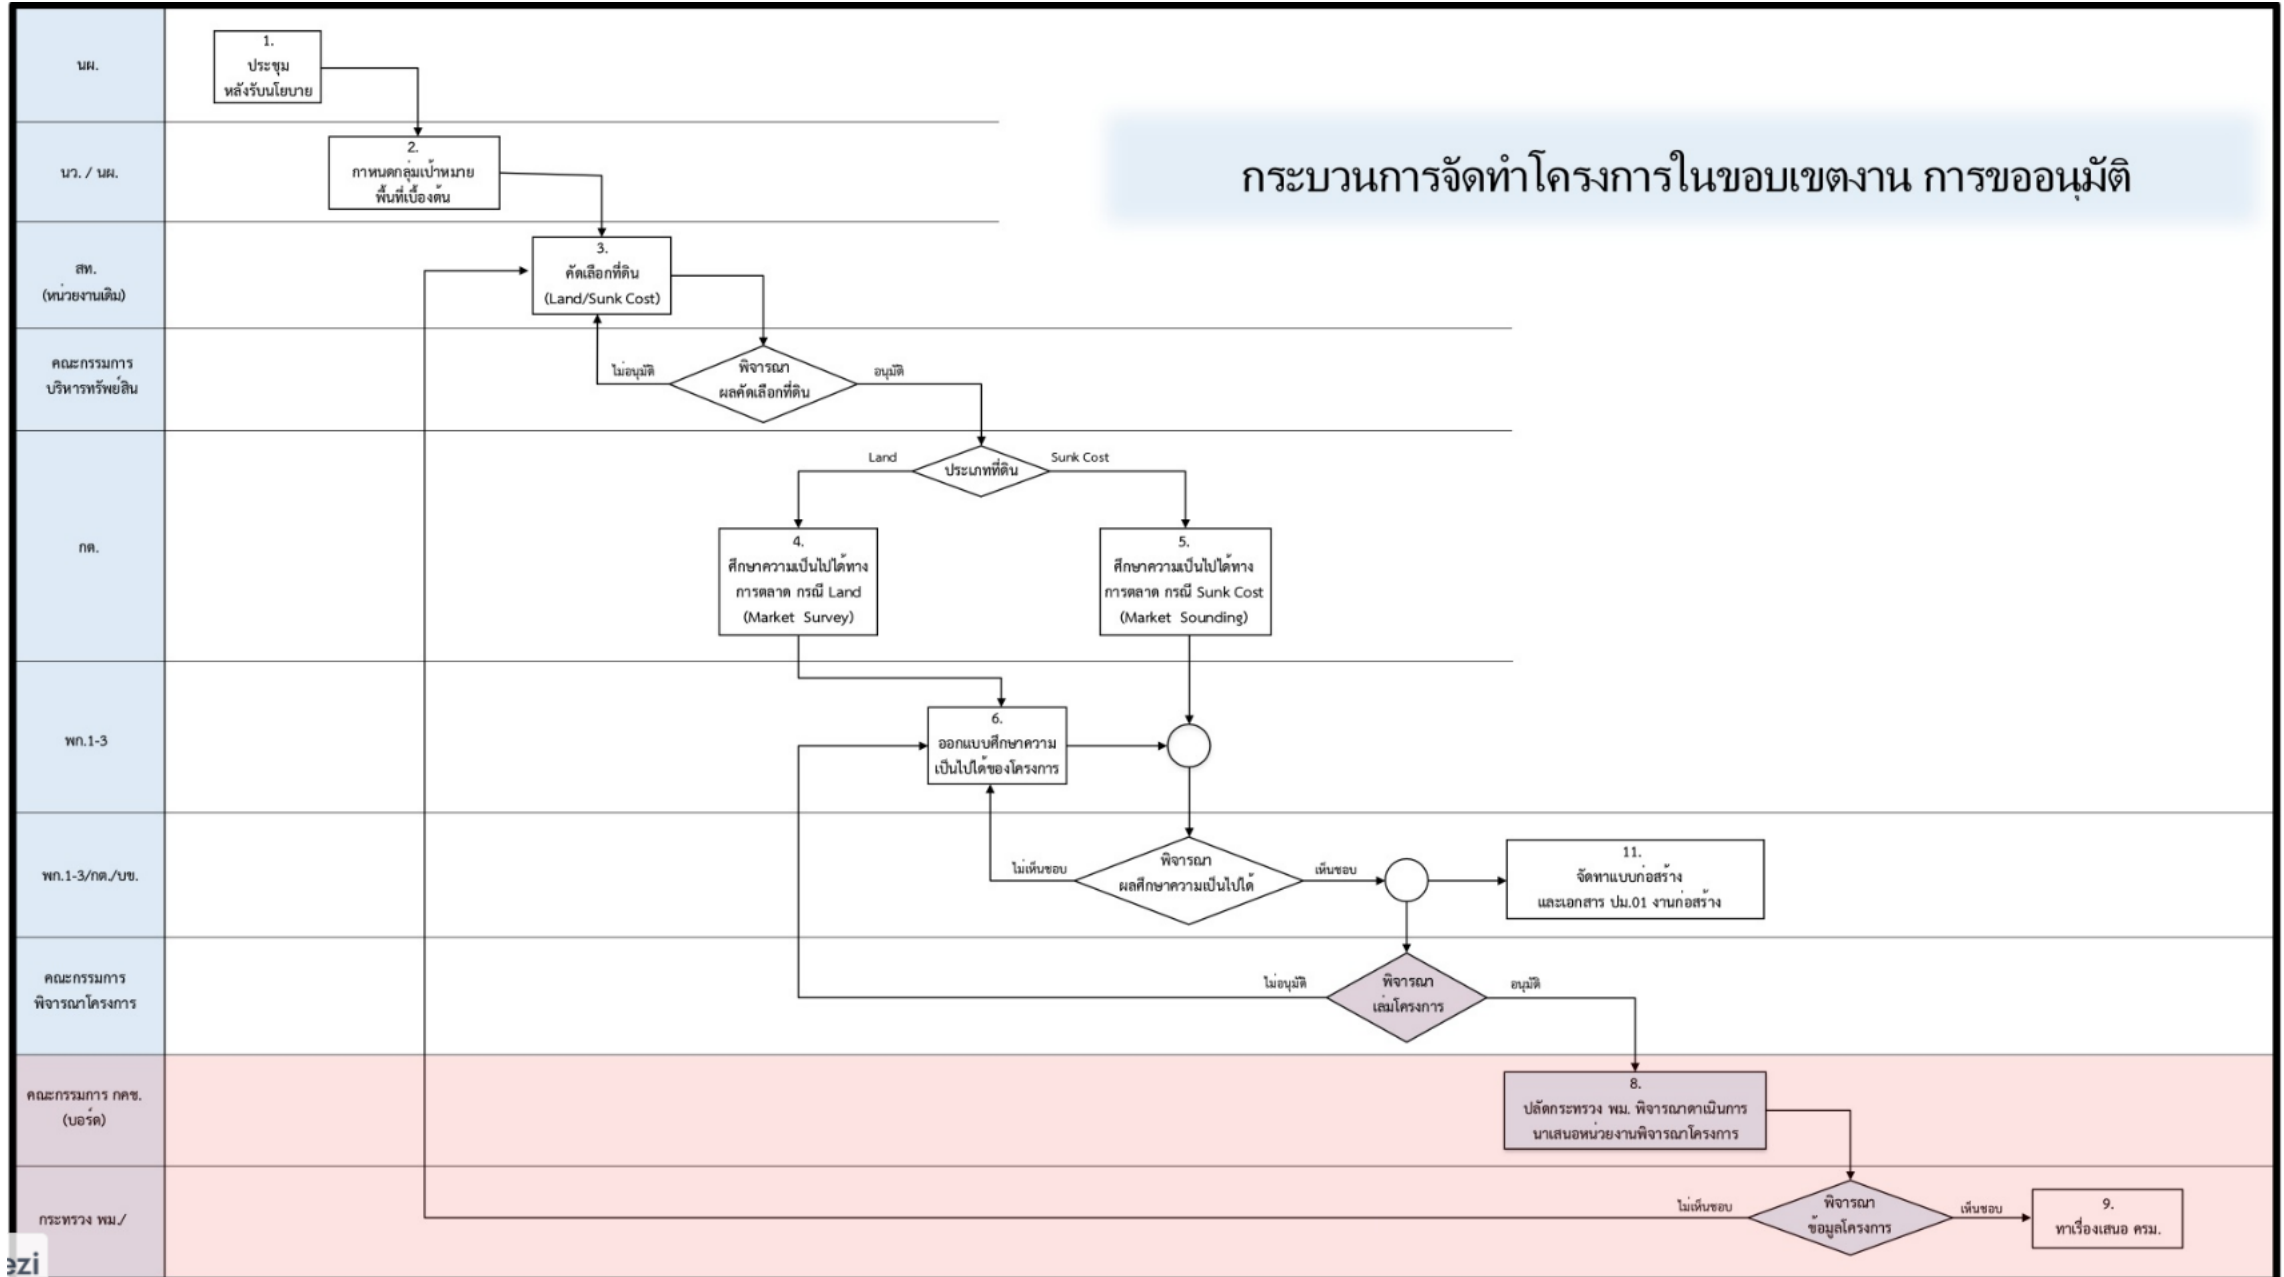



ภายใน

นผ. , พก.1-3, กต. , สว. , บป. , ทด
ใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน

ภายนอก

ใช้เวลา 6 เดือน ขึ้นไป
รวม 2 ปี 2 เดือน




● ปัญหา



● อุปสรรค




1. ขั้นตอนการทำงาน

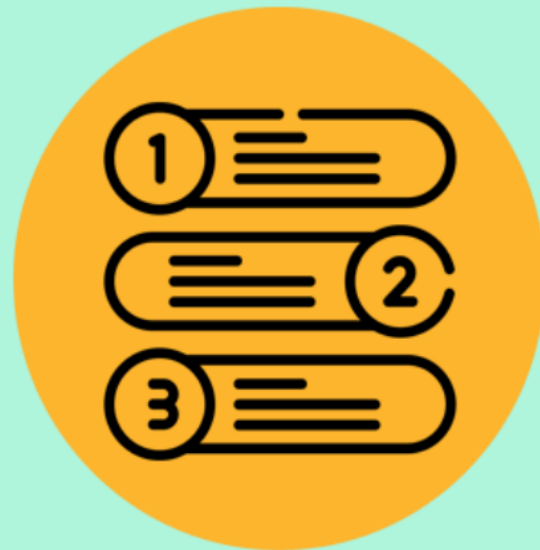

34 ขั้นตอนการทำงาน

2. การแก้ปัญหาที่ ล่าช้า

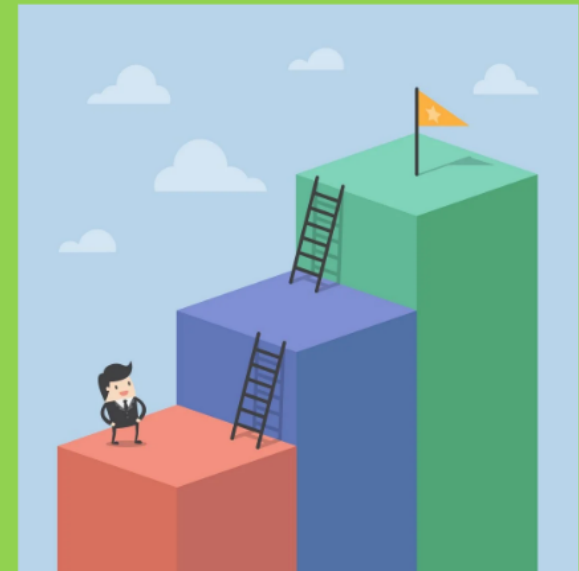



1.การประสานงาน

2.การส่งเอกสาร



3.บุคลากร

ท่านคือ แม่ทัพ



Reports + Take Action

รายงานผล
แบบเต็ม

QR-code

รายงาน
ข้อมูลแบบ
ใหม่




Google Data Studio



Google Sheets
Data Models



Data Studio
Data Sources



Data Studio Reports

Real Time + Online







ผลการดำเนินงานขออนุมัติโครงการเคหะสุขประชา

ดำเนินงานแล้ว
50.00%


ขออนุมัติภายใน
601

ทำงานมาแล้ว (วัน)
357

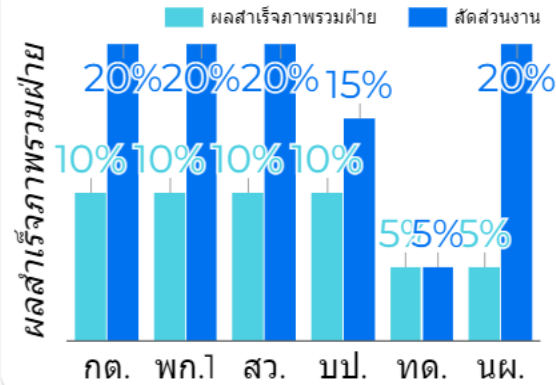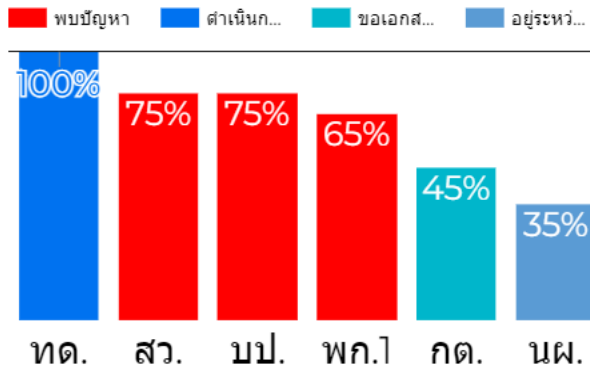

ขั้นตอนการทำงาน			
กต.	สว.	บป.	ทด.
การสำรวจภาคสนาม(4...			ส่งมอบข้อมูลให้หน่วย...
พก.1	งานสำรวจ...สนับสนุนขั...		นผ.
ออกแบบผังโครงการแ...			รับนโยบาย / แปลงนโ...

ฝ่าย	พบปัญหา
บป.	เอกสารจาก พก.1 ไม่ครบถ้วน
พก.1	เปลี่ยนแบบก่อสร้าง
กต.	ไม่มีข้อมูล

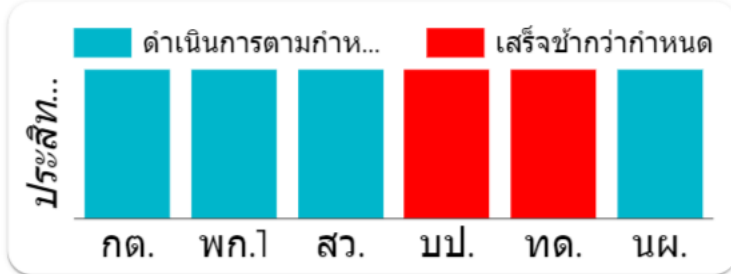

เฉพาะฝ่าย

ข้อเสนอแนะ

ภายนอก

E - doc





ผลการดำเนินงานขออนุมัติโครงการเคหะสุขประชา

ดำเนินงานแล้ว
10.00%

ขออนุมัติภายใน
-

ทำงานมาแล้ว (วัน)
-

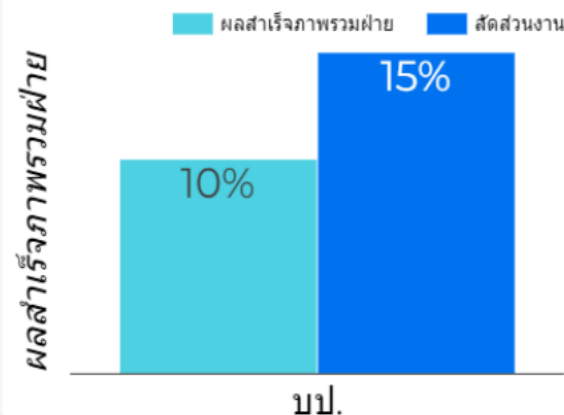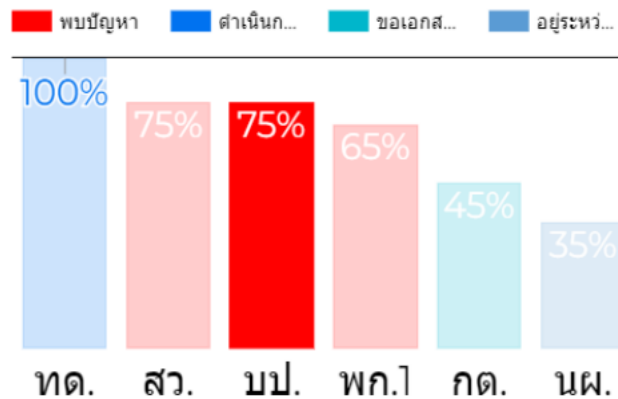

ขั้นตอนการทำงาน บป.

สนับสนุนข้อมูลด้านการเงินและดอกเบี้ยและแหล่งเงิน(75%)

ฝ่าย พบปัญหา ▾

บป. เอกสารจาก พก.1 ไม่ครบถ้วน

ประสิท...

■ เสร็จช้ากว่ากำหนด


บป.

จำนวนวันที่ดำเนินการตามแผน(วัน)

จำนวนวันที่ดำเนินการตามจริง(วัน)

ฝ่าย ▾

ได้รับผิดชอบงาน

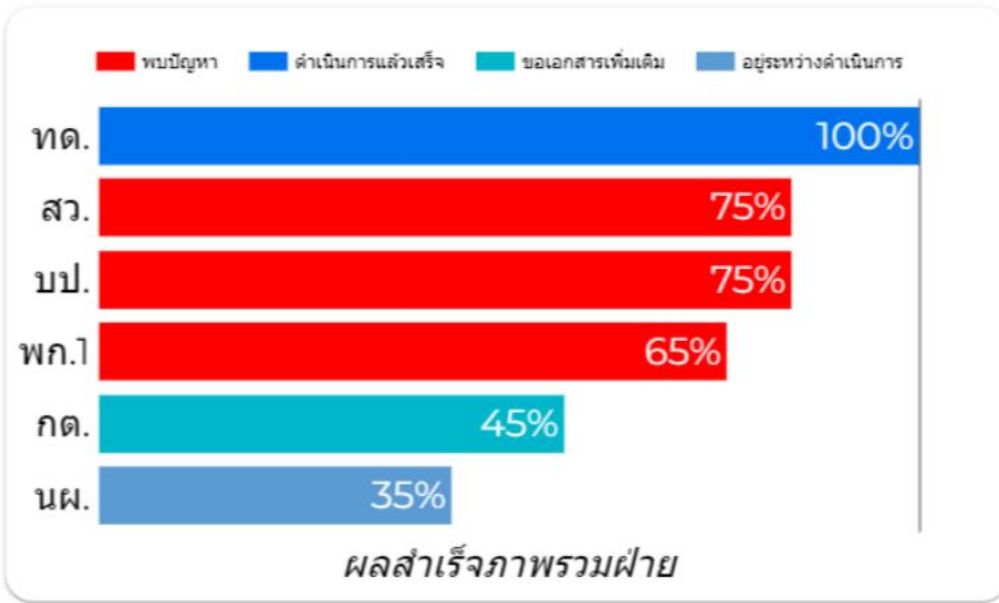

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ▾

ถึง พก.1 แก้ไขแบบ โดยด่วน ! ผว. 24.08.2565
 ดื้อด ทำงานดีมาก ผว.

ฝ่าย ▾	ขั้นตอนการทำงาน (%ผลสำเร็จของ การ)	จำนวนวันที่ ดำเนินการ ตามแผน(วัน)	จำนวนวันที่ดำเนิน การตามจริง(วัน)	กำหนดวัน แล้วเสร็จ	วันที่เริ่ม ทำงาน	วันที่ทำงาน แล้วสุด	วันที่ ทำงาน แล้วเสร็จ
สว.	งานสำรวจภูมิประเทศ(75%)	30	11	27 ก.ย. 2022	18 ส.ค. 2022	29 ส.ค. 2022	-
พก.1	ออกแบบผังโครงการและองค์ประกอบของ โครงการ(65%)	30	12	17 ก.ย. 2022	18 ส.ค. 2022	30 ส.ค. 2022	30 ส.ค. 2022
บป.	สนับสนุนข้อมูลด้านการเงินและดอกเบี้ยและแหล่ง เงิน(75%)	30	31	17 ก.ย. 2022	16 ส.ค. 2022	17 ก.ย. 2022	-
นผ.	รับนโยบาย / แปลงนโยบายมาเป็นแผนปฏิบัติ งาน(35%)	30	17	17 ส.ค. 2022	1 ส.ค. 2022	18 ส.ค. 2022	-
ทด.	ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่ร้องขอแล้ว เสร็จ(100%)	3	5	25 ส.ค. 2022	17 ส.ค. 2022	30 ส.ค. 2022	30 ส.ค. 2022
กต.	การสำรวจภาคสนาม(45%)	150	12	31 ส.ค. 2022	18 ส.ค. 2022	30 ส.ค. 2022	30 ส.ค.

การประชุมครั้งต่อไป ▾
 26 เม.ย. 2022

การประชุมครั้งล่าสุด ▾
 11 ส.ค. 2022

กค.

วันที่ส่งเล่มขอความเห็น ต่อ กค. ▾

17 ส.ค. 2022

พบปัญหาจากการขอความเห็น ต่อ กค.

ไม่มีข้อมูล

สถานะงานล่าสุด กค.

กค.กำลังพิจารณาให้ความเห็น

วันที่อัปเดตสถานะล่าสุดจาก กค. ▾

25 ส.ค. 2022

วันที่ได้รับความเห็นจาก กค.

ไม่มีข้อมูล

ดำเนินการขอความเห็นจาก กค.มาแล้ว (วัน)

8

สศช.

วันที่ส่งเล่มขอความเห็น ต่อ สศช. ▾

21 ส.ค. 2022

พบปัญหาจากการขอความเห็น ต่อ สศช.

ไม่มีข้อมูล

สถานะงานล่าสุดจากสศช.

สศช.กำลังพิจารณาให้ความเห็น

วันที่อัปเดตสถานะล่าสุด จาก สศช... ▾

25 ส.ค. 2022

วันที่ได้รับความเห็นจาก สศช.

ไม่มีข้อมูล

ดำเนินการขอความเห็นจากสศช.มาแล้ว (วัน)

4

สงป.

วันที่ส่งเล่มขอความเห็น ต่อ สงป. ▾

23 ส.ค. 2022

พบปัญหาจากการขอความเห็น ต่อ สงป.

แก้ไขเอกสาร

สถานะงานล่าสุด สงป.

กคช.กำลังแก้เอกสาร

วันที่อัปเดตสถานะล่าสุดจาก สงป. ▾

26 ส.ค. 2022

วันที่ได้รับความเห็นจาก สงป.

ไม่มีข้อมูล

ดำเนินการขอความเห็นจากสงป.มาแล้ว(วัน)

3

กรม.

วันที่ขออนุมัติ ต่อ กรม. ▾

10 ส.ค. 2022

พบปัญหาจากการขออนุมัติ ต่อ กรม.

ไม่มีข้อมูล

สถานะการขออนุมัติ

รอเข้าประชุม กรม.วันที่ 26.08.2565

วันที่อัปเดตสถานะล่าสุดจาก กรม. ▾

23 ส.ค. 2022

อนุมัติโครงการวันที่

ไม่มีข้อมูล

ดำเนินการขออนุมัติมาแล้ว(วัน)

13



การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority



ระบบค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเคหะสุขประชา

ฝ่าย


เลขหนังสือ

เรื่อง

ผู้ส่ง

ผู้รับ

จำนวนเอกสารทั้งหมด
3

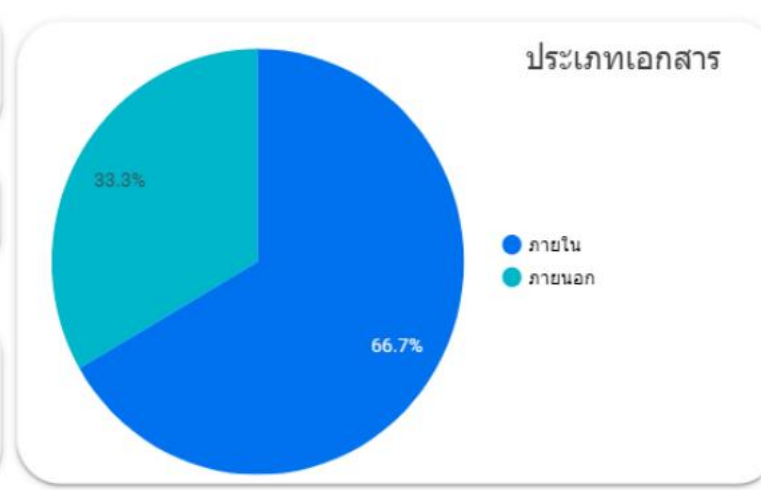

ฝ่าย	เลขหนังสือ	เลขทะเบียน	เอกสาร	ผู้ส่ง	ผู้รับ
นพ.	พม.5102/2533	100300	<u>บันทึกการประชุม</u>	สมชาย พ.บริหารงานทั่วไป นพ.	-
กต.	พม.5151/2533	100220	<u>สำรวจตลาด</u>	สันติ พ.ออกแบบ บค.1 พก.1	-
สว.	พม.5108/2511	100111	<u>บันทึกสำรวจภูมิประเทศ</u>	สันดา นิตกร 3 .สว.	สัน




Google Data Studio

รู้ปัญหาเร็ว



รายงานไว



แก้ไขทัน



ลดเวลาอนุมัติ



ลูกค้า

กคช.

- ได้บ้านตรงเวลา / เร็วขึ้น



- ลดค่าใช้จ่าย

- คุณภาพชีวิตดีขึ้น



ประหยัดเวลา

การจัดการ
ข้อมูล

กำหนด
ตัวชี้วัด

ยุติธรรม


จากการประสานงาน + ส่งเอกสาร
อย่างน้อย วันละ 1 ชม.

จะประหยัดเวลา ในการขออนุมัติ
โดยประมาณ ไป อย่างน้อย
608 ชม.

ติดตามขออนุมัติได้ ทุกที่ ทุกเวลา



shutterstock.com · 1914565942

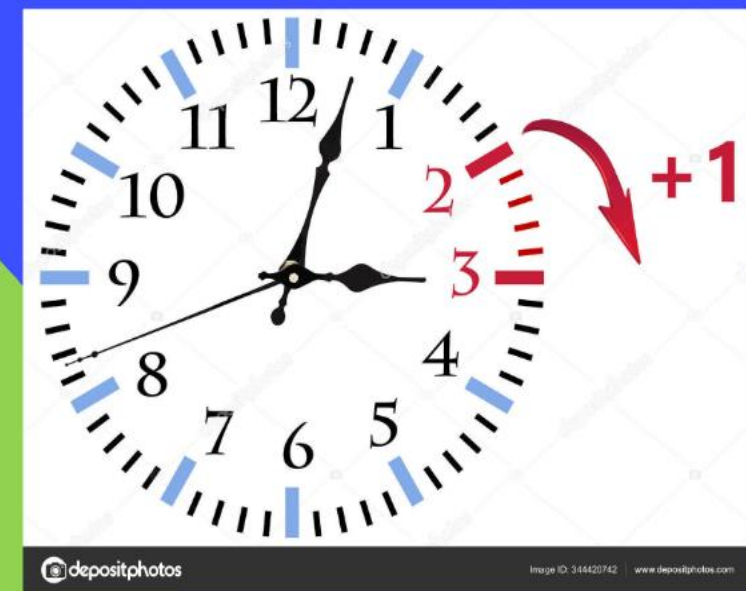

depositphotos

Image ID: 344420742 www.depositphotos.com

นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับ แผน

ฝ่าย พบปัญหา ▾

- บป. เอกสารจาก พก1.ไม่ครบถ้วน
- พก.1 เปลี่ยนแบบก่อสร้าง
- สว. เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนัก, น้ำท่วมพื้นที่, พื้นที่รกร้าง, อบต.มาขอตรง ระบายน้ำข้างถนนทำให้เข้าพื้นที่ลำบาก

ฝ่าย พบปัญหา ▾


- บป. เอกสารจาก พก1.ไม่ครบถ้วน
- พก.1 เปลี่ยนแบบก่อสร้าง
- สว. เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนัก, น้ำท่วมพื้นที่, พื้นที่รกร้าง, อบต.มาขอตรง ระบายน้ำข้างถนนทำให้เข้าพื้นที่ลำบาก

ฝ่าย พบปัญหา ▾

- บป. เอกสารจาก พก1.ไม่ครบถ้วน
- พก.1 เปลี่ยนแบบก่อสร้าง
- สว. เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนัก, น้ำท่วมพื้นที่, พื้นที่รกร้าง, อบต.มาขอตรง ระบายน้ำข้างถนนทำให้เข้าพื้นที่ลำบาก

ฝ่าย พบปัญหา ▾

- บป. เอกสารจาก พก1.ไม่ครบถ้วน
- พก.1 เปลี่ยนแบบก่อสร้าง

 Prezi เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนัก, น้ำท่วมพื้นที่, พื้นที่รกร้าง, อบต.มาขอตรง ระบายน้ำข้างถนนทำให้เข้าพื้นที่ลำบาก

การส่งอีเมล

ตั้งเวลาการส่งอีเมลสำหรับรายงานนี้ [ดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)

จาก สันดา นพคุณ

ถึง  สันดา นพคุณ [เพิ่มผู้รับเพิ่มเติม](#)

ปรับแต่งเรื่องและข้อความอีเมล

หน้า ภายใน, ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร, นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง, ภา... ▾

เวลาเริ่มต้น 29/8/2022  08:00  GMT+0700 ไทย

เล่นซ้ำ [รายวัน](#)

ทุกวันจันทร์

ทุกเดือน ในวันจันทร์สุดท้าย

ทุกวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

ยกเลิก

กำหนดการ


กำหนดตัวชี้วัดเป็น
SLA , KPI ได้ทั้งภาพรวม
และรายกิจกรรม



ใช้ระบบในการเก็บตัวชี้วัด
จะได้รับข้อมูลที่เป็นจริง

1. ตัวชี้วัดที่เป็นจริง เป็นข้อมูล
สำหรับการเลื่อนขั้น ที่ยุติธรรม

2. ไม่ทำงาน จะไม่เป็นความลับ

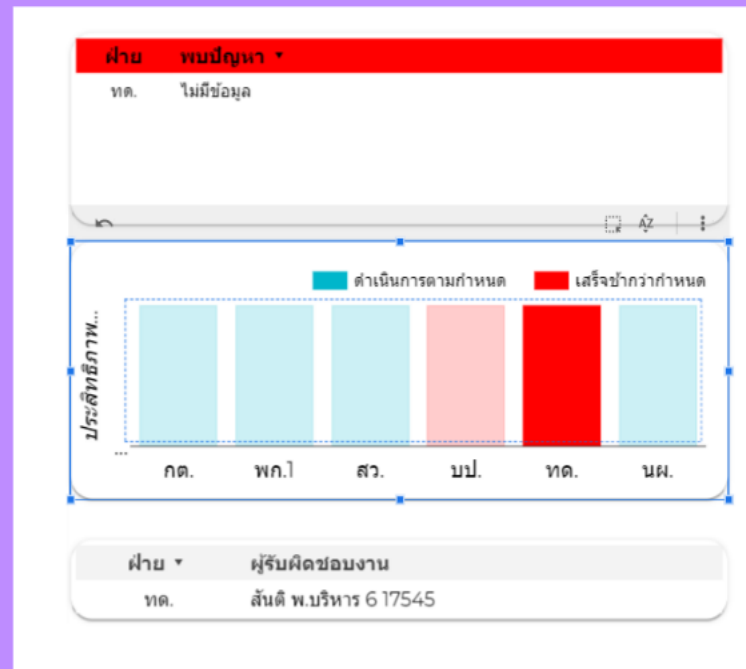

มีหน่วยงานนำไปใช้แล้ว

- 3 กอง
- กองสัญญางานก่อสร้าง
 - กองสัญญางานพัสดุ
 - กองประมูลงานก่อสร้าง

มีพนักงานการเคหะแห่งชาติ
เห็นด้วยและอยากให้นำไปใช้ต่อ กว่า 100 คน





ผู้ร่วมทำงาน รุ่นที่ 1 กลุ่ม 3 ขอขอบคุณที่ให้โอกาสนำเสนอผลงาน

